

### 高浜発電所1号機の状態について（お知らせ）

2023年7月26日  
 関西電力株式会社

	内 容
<p style="text-align: center;">実 績</p> <p style="text-align: center;">7月25日 9時 ～ 7月26日 9時</p>	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・起動試験実施中（7月21日開始）</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月25日 加圧器逃がし弁漏えい検査</li> <li>・7月25日 補助給水系機能検査</li> <li>・7月25日 1次系換気空調設備検査</li> </ul> </li> <li>○使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;">予 定</p> <p style="text-align: center;">7月26日 9時 ～ 7月27日 9時</p>	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・起動試験（7月21日開始）</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助給水系機能検査</li> <li>・1次系換気空調設備検査</li> </ul> </li> <li>○使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul>


# 高浜発電所1号機の再稼働にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.7.26 9:00時点

原子炉 臨界 並列 定格熱出力  
 起動 7月下旬 8月上旬 一定運転  
 (7/28) (7/29) (8/2) (8/5)  
 8月下旬 (8/28)

燃料装荷 6/22  
 燃料装荷 (約4日) 6/25  
 原子炉容器組立 (約9日) 7/4  
 非常用ディーゼル発電機検査 (約2日) 7/6  
 原子炉格納容器全体漏えい率検査 (約8日) 7/14  
 1次冷却材系統漏えい検査 (約6日) 7/20  
 起動前弁点検 (約1日) 7/21  
 1次冷却材系統昇温・昇圧 7/21  
 原子炉起動・臨界・タービン起動 約4日  
 発電機並列・調整運転 約4日  
 調整運転

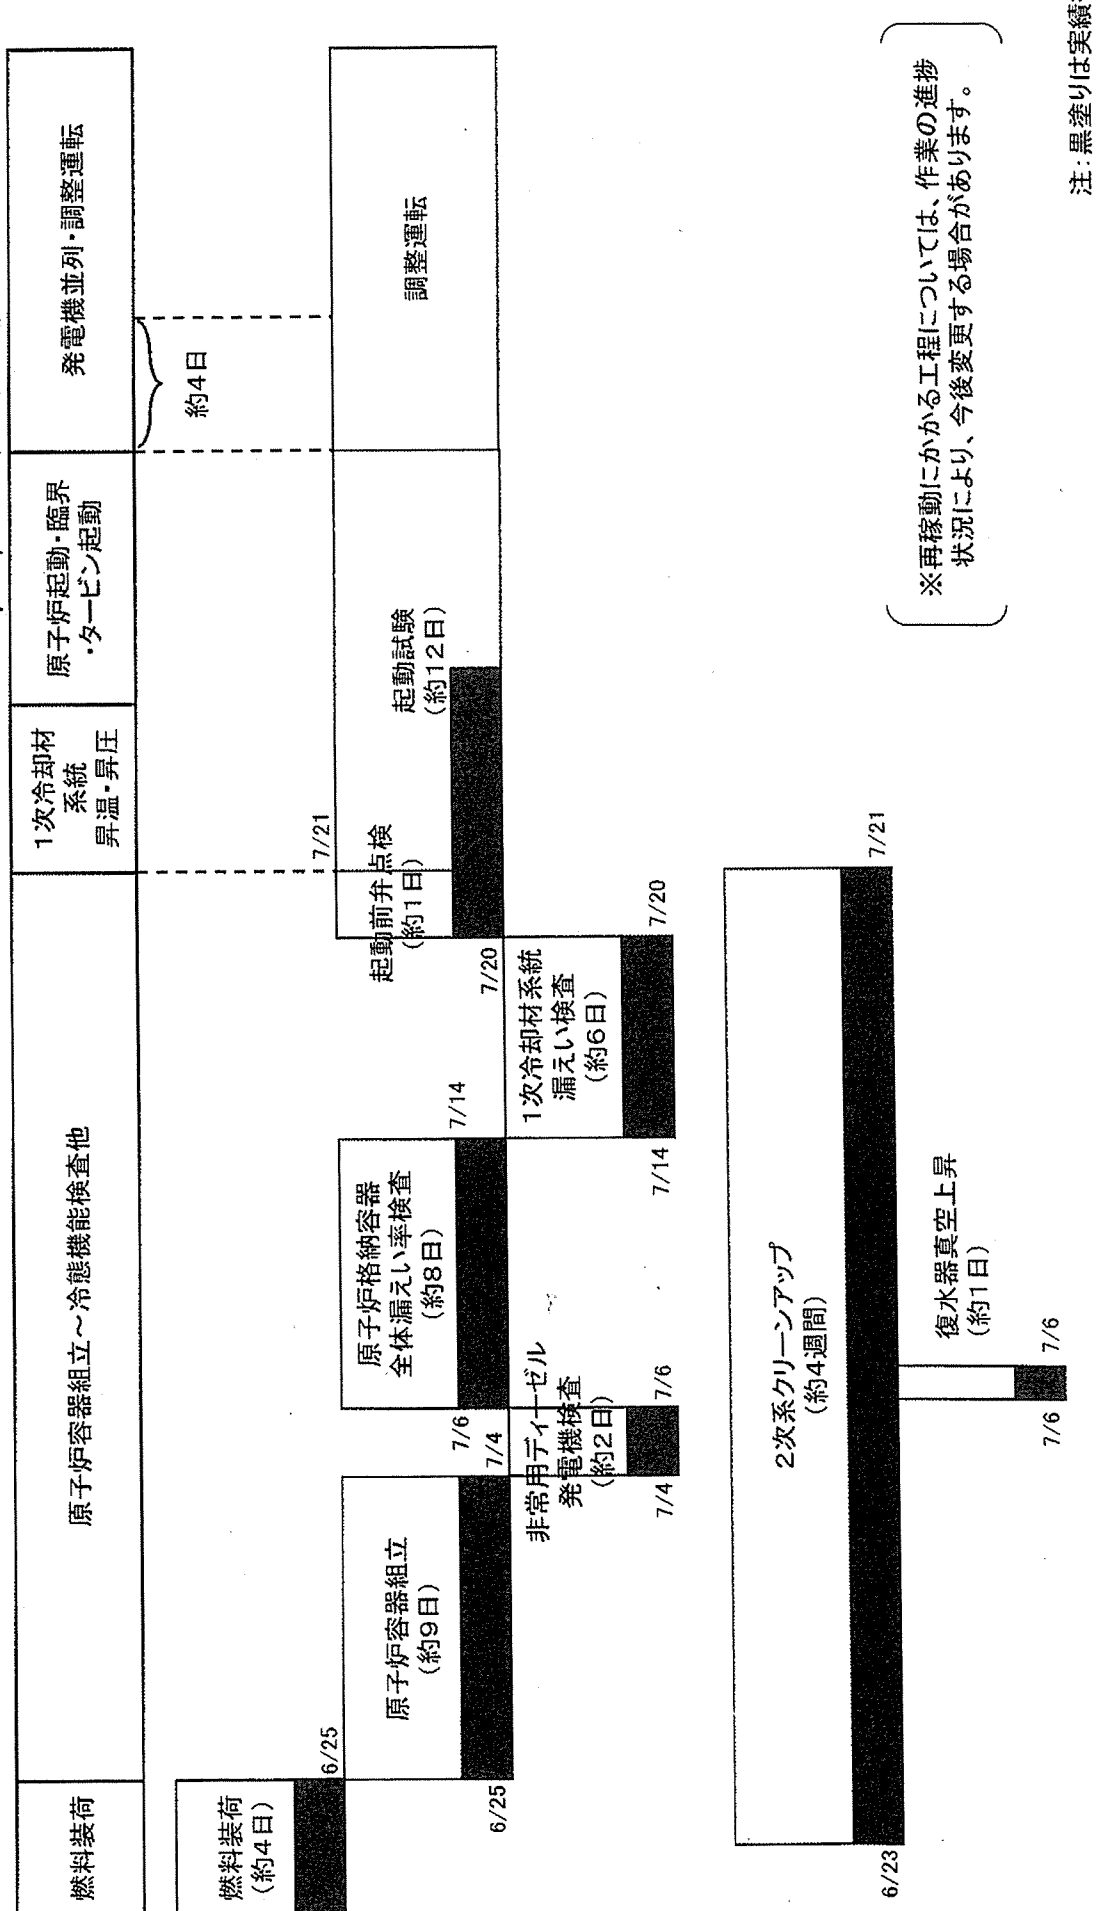

※再稼働にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注：黒塗りは実績を示す

高浜発電所 1号機 プラントパラメータ (2023年7月26日 09:00時点)

