

平成 1 9 年度

第 5 回岐阜県事業評価監視委員会

【河川課所管事業審議資料】

再評価対象箇所一覧表 1
再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 総合流域防災事業 2
平成 1 9 年度 再評価実施箇所（附図）	
総合流域防災事業（ ^{にしでがわ} 西出川） 3

平成19年度 再評価対象箇所一覧表 (岐阜市)

番号	事業名	路線・河川名	箇所名 (市町村名)	工区名	採択 年度	完了 予定 年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数	現況の安 全度 (1/年)	社会情勢 の変化	地元の評 価・協力 体制	効果分析	対応方針	特記事項
							全体事業 量	実施済事 業量	事業実 施率	用地補償費	用地補償費	用地補償費										
													H18年度末	工事費等	工事費等							
1	総合流域防災 事業	木曽川水系 1級河川 伊自良川	岐阜市	(準用河川) 西出川	H5	H25	1,188m	255m	21%	2,000	887	44	15	概ね 1/1.1年	着工時よ りも宅地 化が進行	協力的 である	10.9	継続				
										916	528	58										
										1,084	359	33										


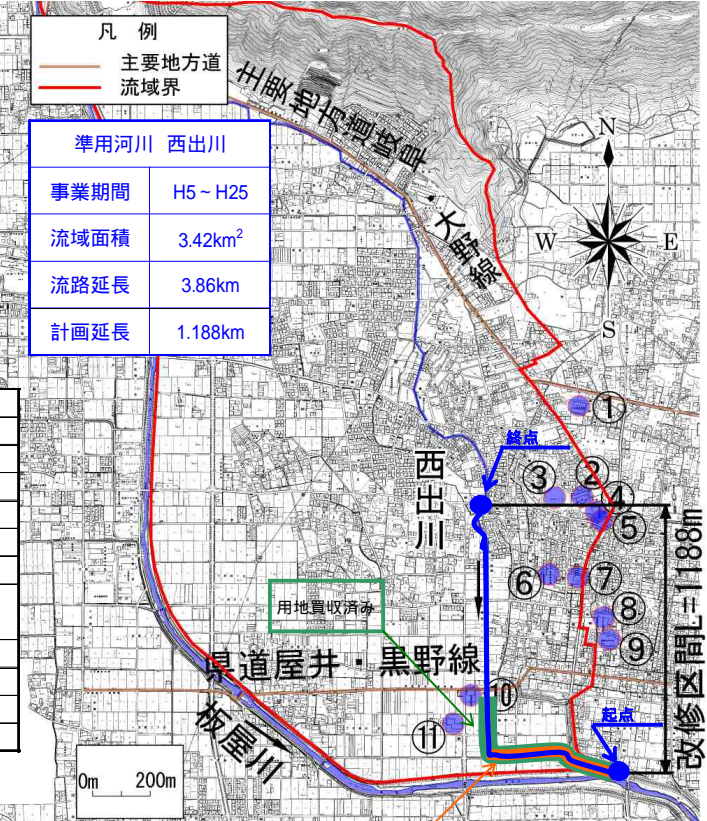


平成19年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について

別紙1

課： 河川課

事業制度について	事業名	総合流域防災事業（準用河川）	
	事業目的	流域（圏域）単位で水害対策と土砂災害対策、ハード対策とソフト対策を一体的に実施し、豪雨災害に対し流域一体となった総合的な対策を推進する。 （一定計画により一定区間の浸水被害を未然に防止するため、河川改修を実施し国土の保全と民生の安定を図る）	
	採択基準	総事業費が概ね4億円以上24億円以内の準用河川に係る河川工事で、氾濫被害が防止される区域内の農耕地が60ha以上で、50戸以上の家屋又は5ha以上の宅地が存するもの。宅地開発、区画整理、土地改良等の事業に関連して、当該河川工事が必要となるもの。	
	概要 （メニュー）	<ul style="list-style-type: none"> ・築堤工 ・掘削工 ・護岸工 ・橋梁工 	
費用対効果の分析について *費用便益B/C*	効果の項目	うち貨幣換算する項目《B》	<ul style="list-style-type: none"> ・家屋資産 ・家庭用品資産 ・事業所資産（償却・在庫資産） ・農漁家資産（償却・在庫資産） ・農作物資産（水田・畑） ・公共土木施設等
		その他項目	
	費用《C》の算定	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費と維持管理費の合計 ・評価対象期間は整備期間+50年とする ・現在価値化に用いる割引率は4%（B及びC共通） ・維持管理項目は、毎年定常的に支出される除草等、定期的に支出される維持修繕等の費用を50年間にわたり計上する 	
費用便益費の基準	<ul style="list-style-type: none"> ・費用便益比が1以上 		

平成 19 年度 再評価実施箇所（附図）

番 号		事 業 名 (路線・河川名等)	総合流域防災事業（準用河川） (西出川)																																										
事業実施箇所	岐阜市	事業主体	岐阜市																																										
採択年度	平成 5 年	完成予定年度	平成 25 年																																										
再評価の実施基準	再評価実施後、一定期間を経過している事業																																												
事業目的	西出川は、岐阜市の北西部を流下する河川であり、河積狭小で流下能力が不足しており、過去にたびたび浸水被害を受けている。本事業では築堤・掘削・護岸により河積の拡大を図り、浸水被害の軽減を図ることを目的とする。																																												
事業概要	西出川 総合流域防災事業（準用河川） 事業延長：L = 1,188m 事業内容：築堤工、掘削工、護岸工、道路橋、樋管工																																												
概 要 図	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p style="text-align: center;">岐阜市</p> </div> <div style="width: 65%;"> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><th colspan="2">準用河川 西出川</th></tr> <tr><td>事業期間</td><td>H5 - H25</td></tr> <tr><td>流域面積</td><td>3.42km²</td></tr> <tr><td>流路延長</td><td>3.86km</td></tr> <tr><td>計画延長</td><td>1.188km</td></tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><th>番号</th><th>施設名</th></tr> <tr><td>1</td><td>黒野保育園</td></tr> <tr><td>2</td><td>黒野小学校</td></tr> <tr><td>3</td><td>黒野小学校校庭</td></tr> <tr><td>4</td><td>黒野児童館</td></tr> <tr><td>5</td><td>黒野保育所</td></tr> <tr><td>6</td><td>黒野西公園</td></tr> <tr><td>7</td><td>黒野公民館</td></tr> <tr><td>8</td><td>黒野共栄館</td></tr> <tr><td>9</td><td>ひかり幼稚園</td></tr> <tr><td>10</td><td>あそか苑(老人介護施設)</td></tr> <tr><td>11</td><td>西部事務所</td></tr> <tr><td>12</td><td>西部コミュニティセンター</td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>工事費等</td><td>359百万円</td></tr> <tr><td>用地補償費</td><td>528百万円</td></tr> <tr><td>延長費</td><td>21%</td></tr> </table> </div> </div> </div> </div>			準用河川 西出川		事業期間	H5 - H25	流域面積	3.42km ²	流路延長	3.86km	計画延長	1.188km	番号	施設名	1	黒野保育園	2	黒野小学校	3	黒野小学校校庭	4	黒野児童館	5	黒野保育所	6	黒野西公園	7	黒野公民館	8	黒野共栄館	9	ひかり幼稚園	10	あそか苑(老人介護施設)	11	西部事務所	12	西部コミュニティセンター	工事費等	359百万円	用地補償費	528百万円	延長費	21%
準用河川 西出川																																													
事業期間	H5 - H25																																												
流域面積	3.42km ²																																												
流路延長	3.86km																																												
計画延長	1.188km																																												
番号	施設名																																												
1	黒野保育園																																												
2	黒野小学校																																												
3	黒野小学校校庭																																												
4	黒野児童館																																												
5	黒野保育所																																												
6	黒野西公園																																												
7	黒野公民館																																												
8	黒野共栄館																																												
9	ひかり幼稚園																																												
10	あそか苑(老人介護施設)																																												
11	西部事務所																																												
12	西部コミュニティセンター																																												
工事費等	359百万円																																												
用地補償費	528百万円																																												
延長費	21%																																												
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  <p style="color: red; text-align: center;">改修済み区間の状況</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p style="color: red; text-align: center;">起点から下流の状況</p> </div> </div>																																												
